




Stadskantoor Utrecht


Draaiboek uitvoering

10-03-2011

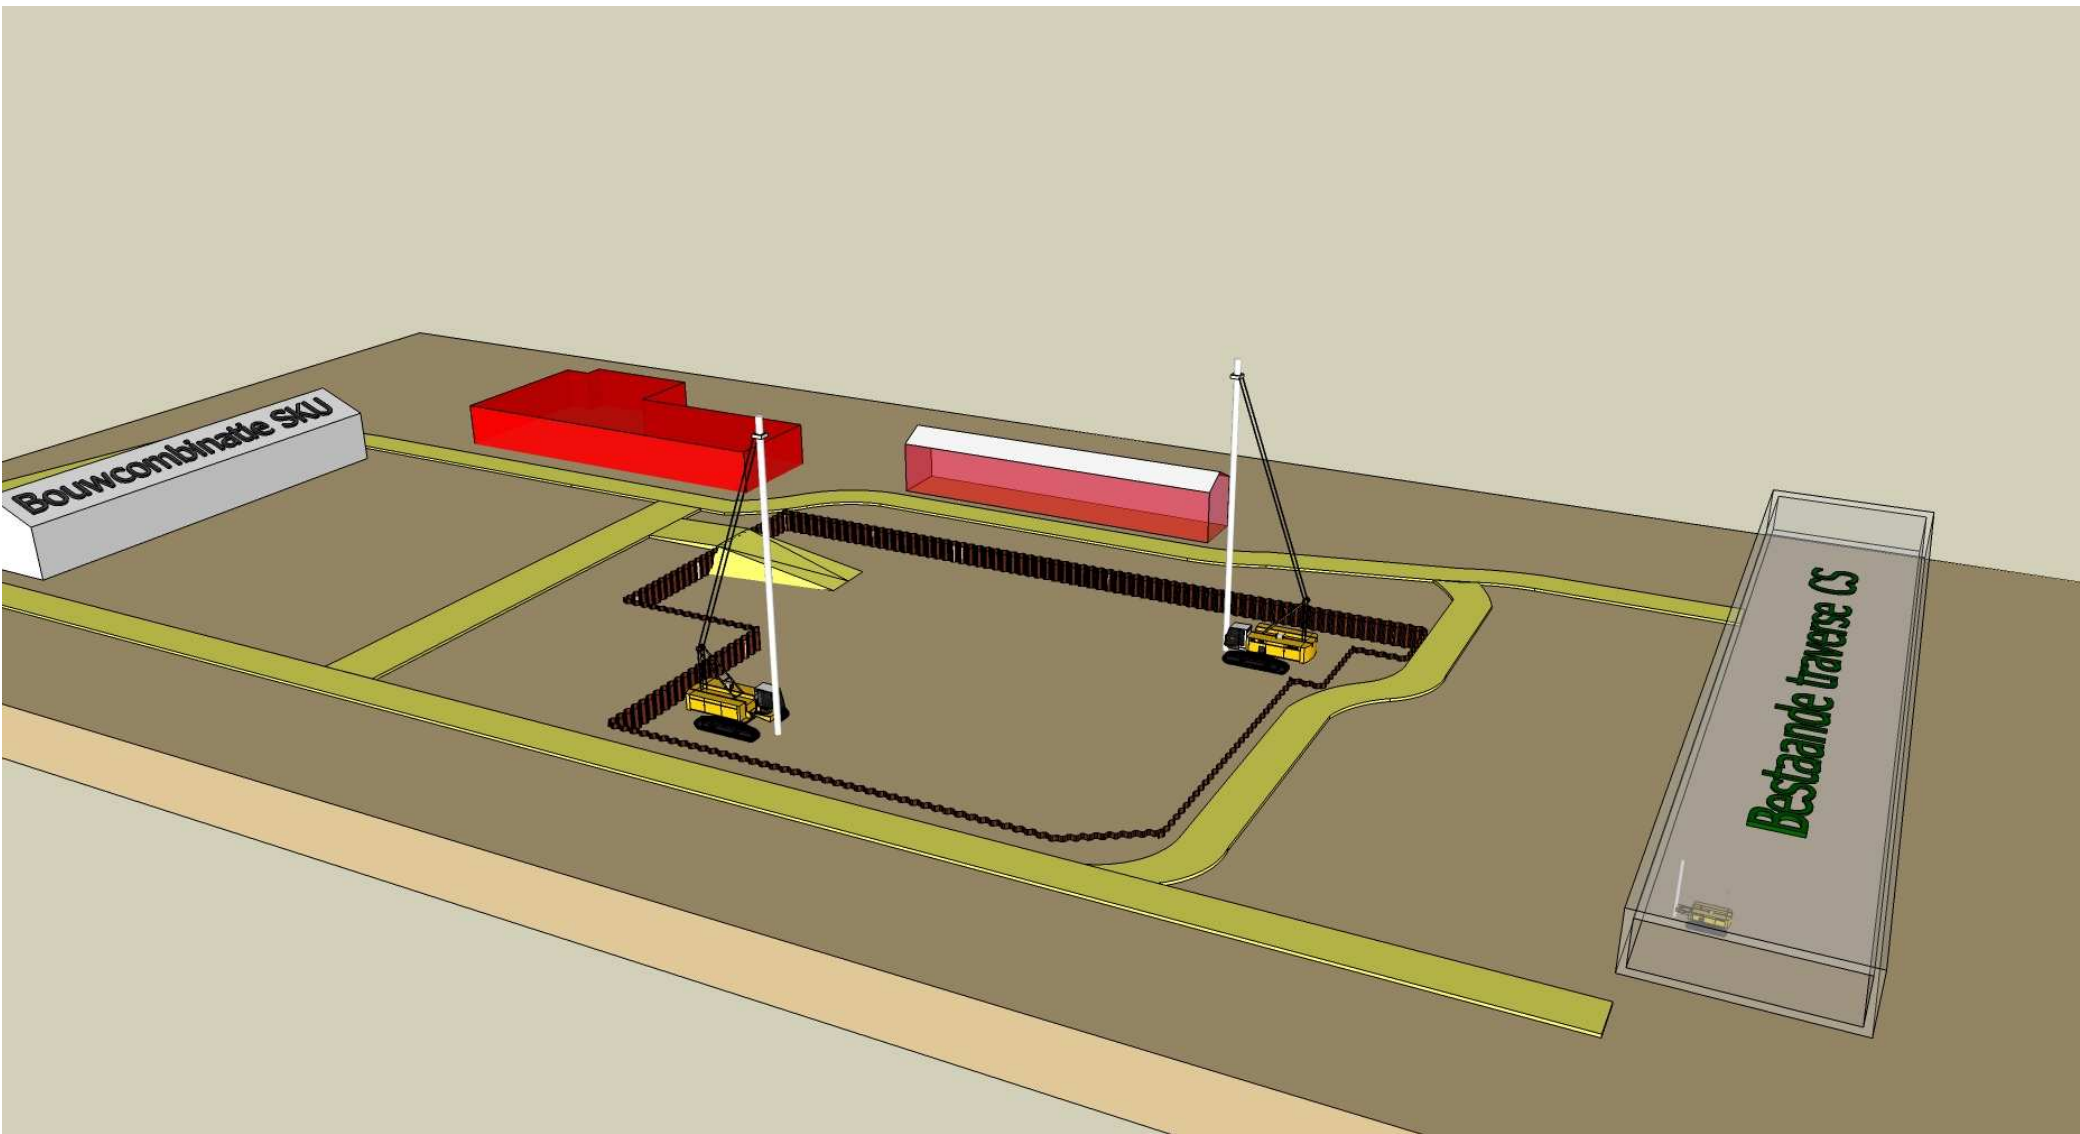

Noord heiwerk repareren waterglas injectie, ontgraven


heiwerk (stelling uit bouwput noord) Zuid

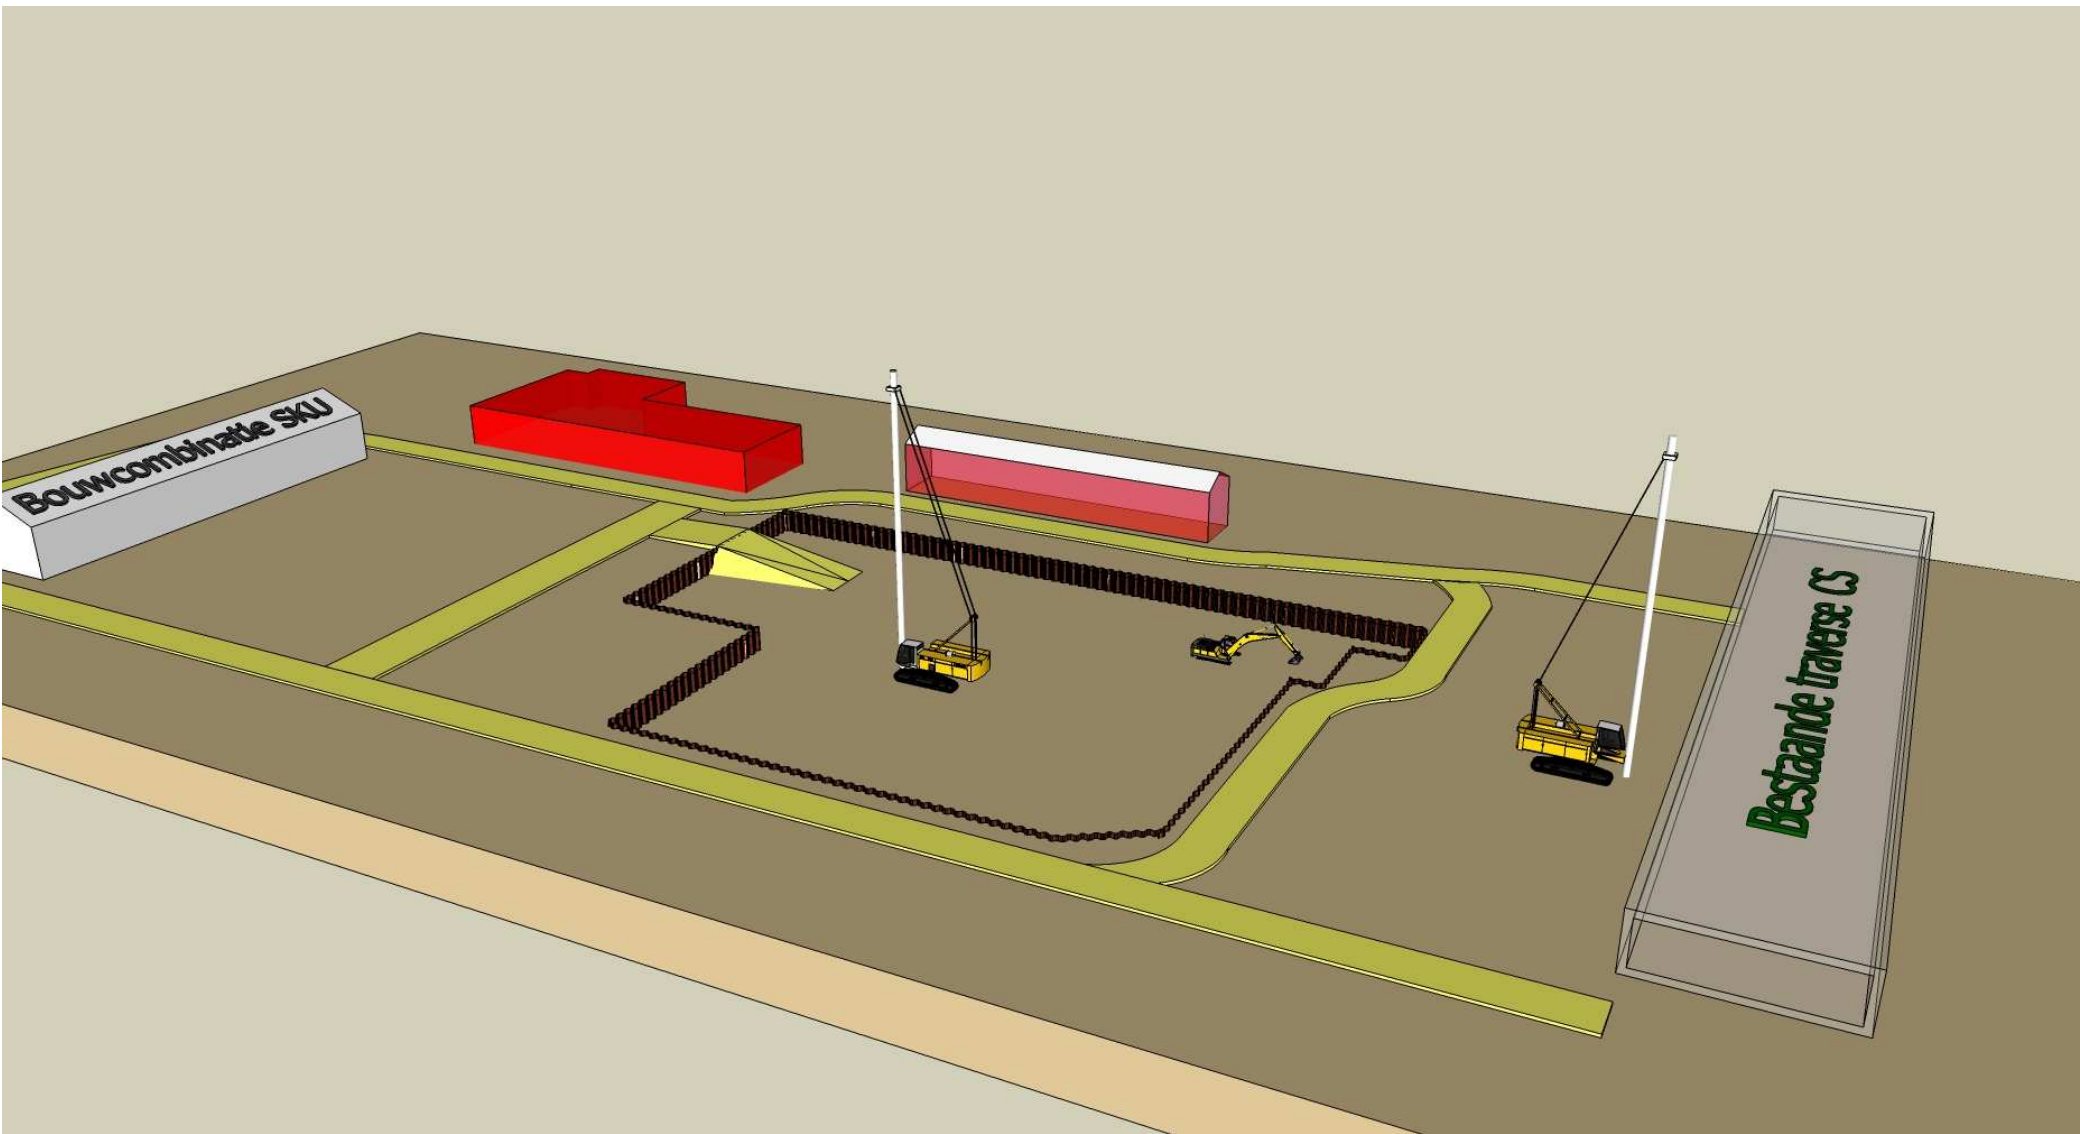

Noord einde heiwerk
ontgraven, koppen snellen


damwanden aanbrengen
waterglas injectie / ontgraven / koppen snellen

Zuid

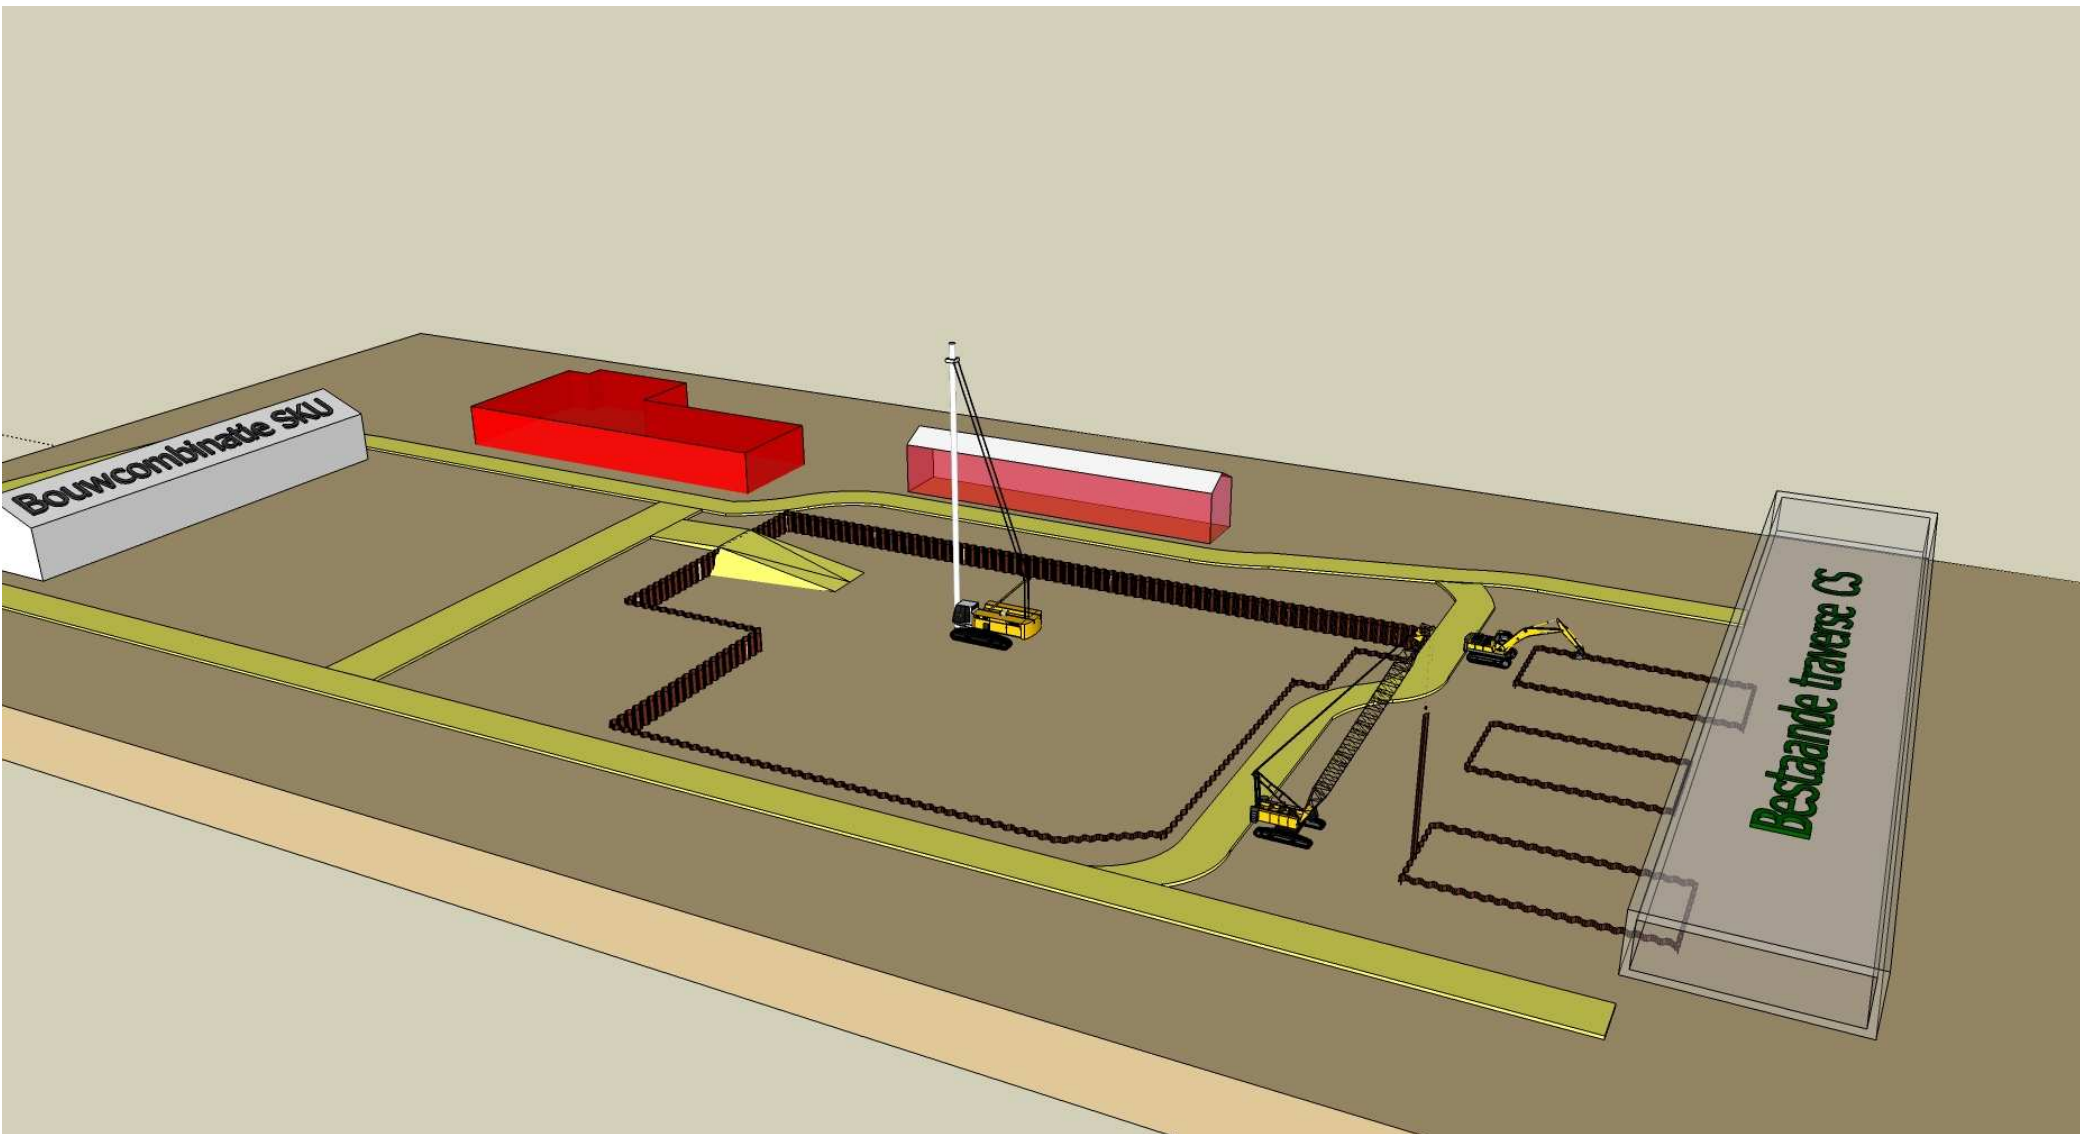


Noord ontgraven
koppen snellen

poeren Zuid

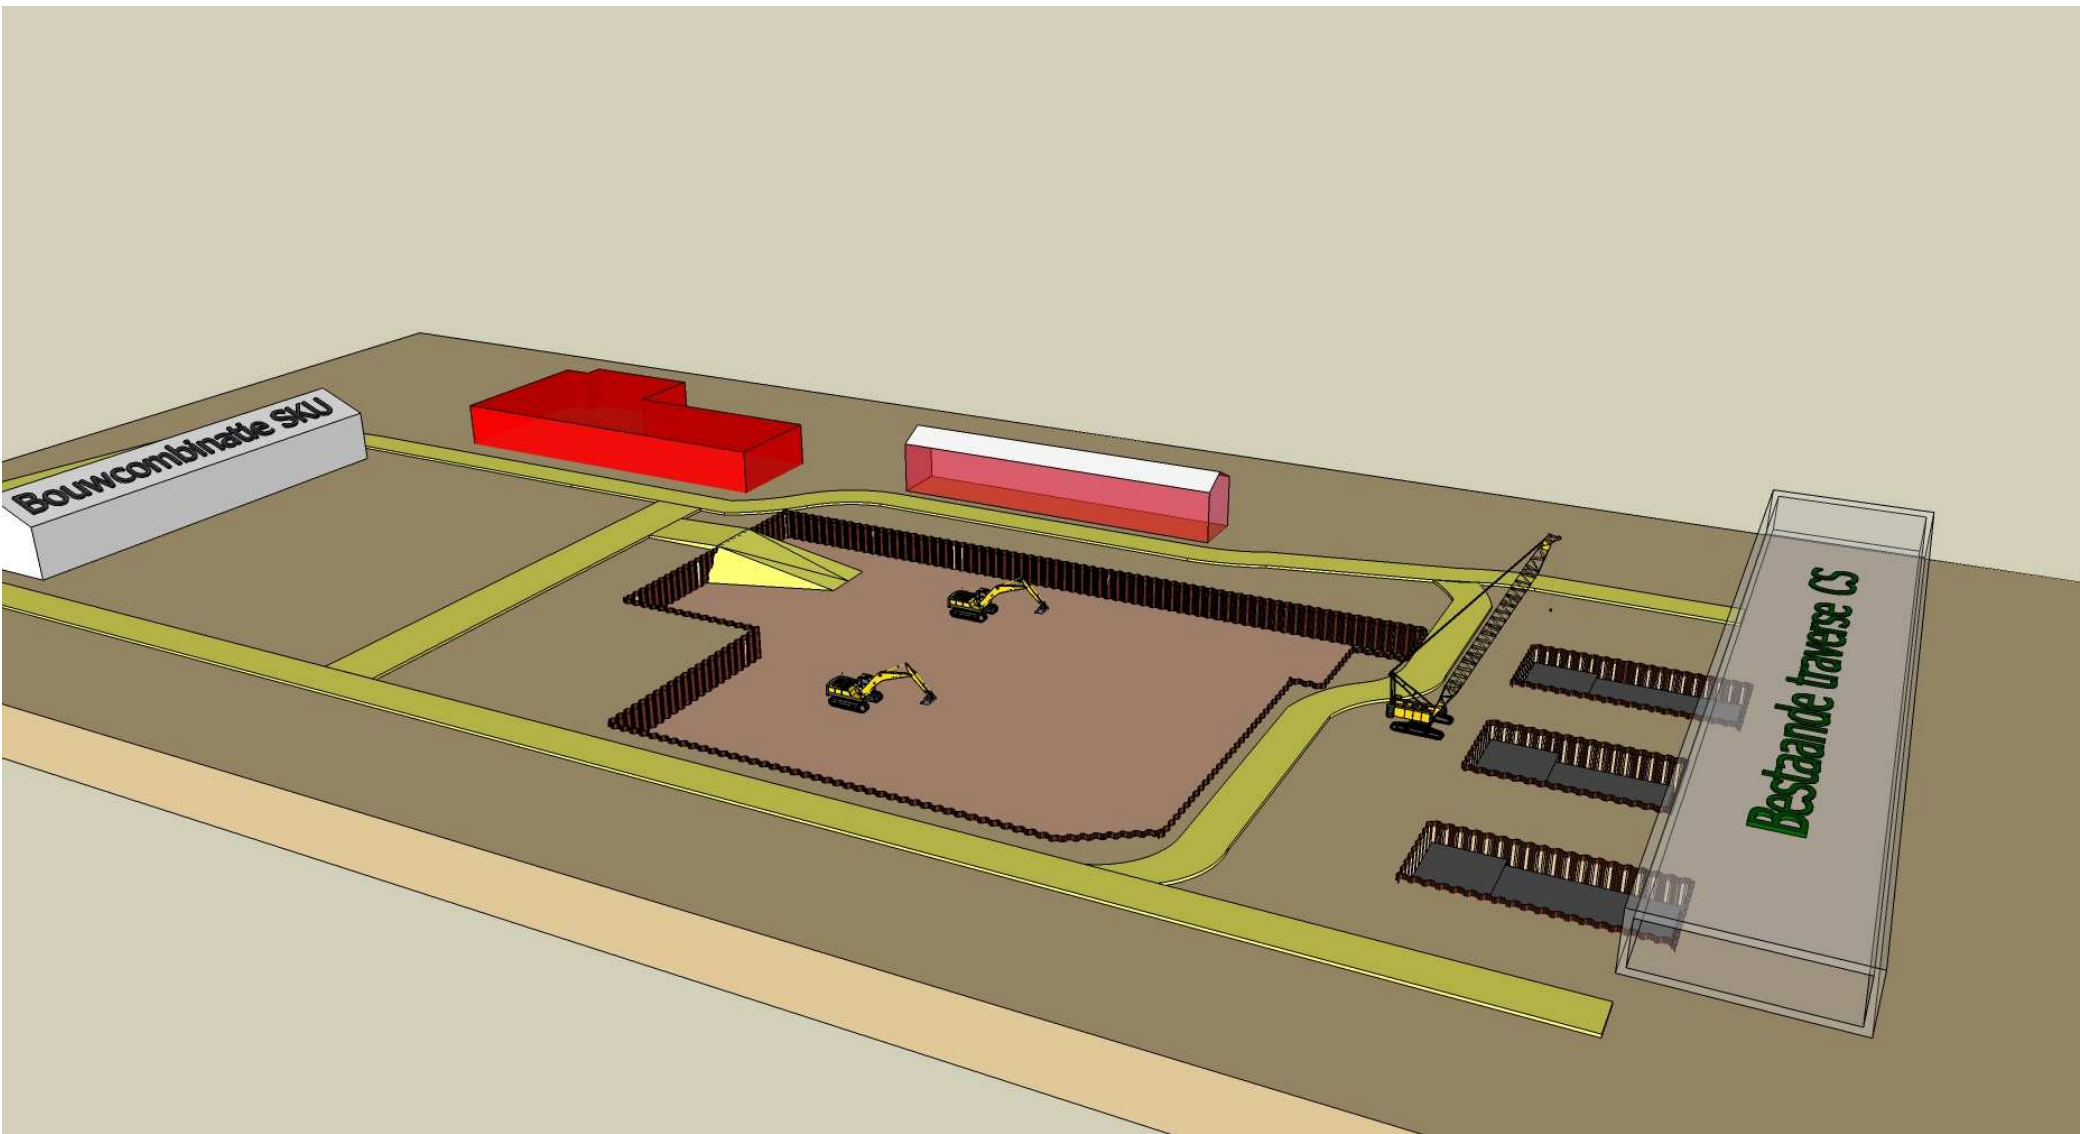


Noord start betonwerk poeren / putten

poeren Zuid
kraanpoer

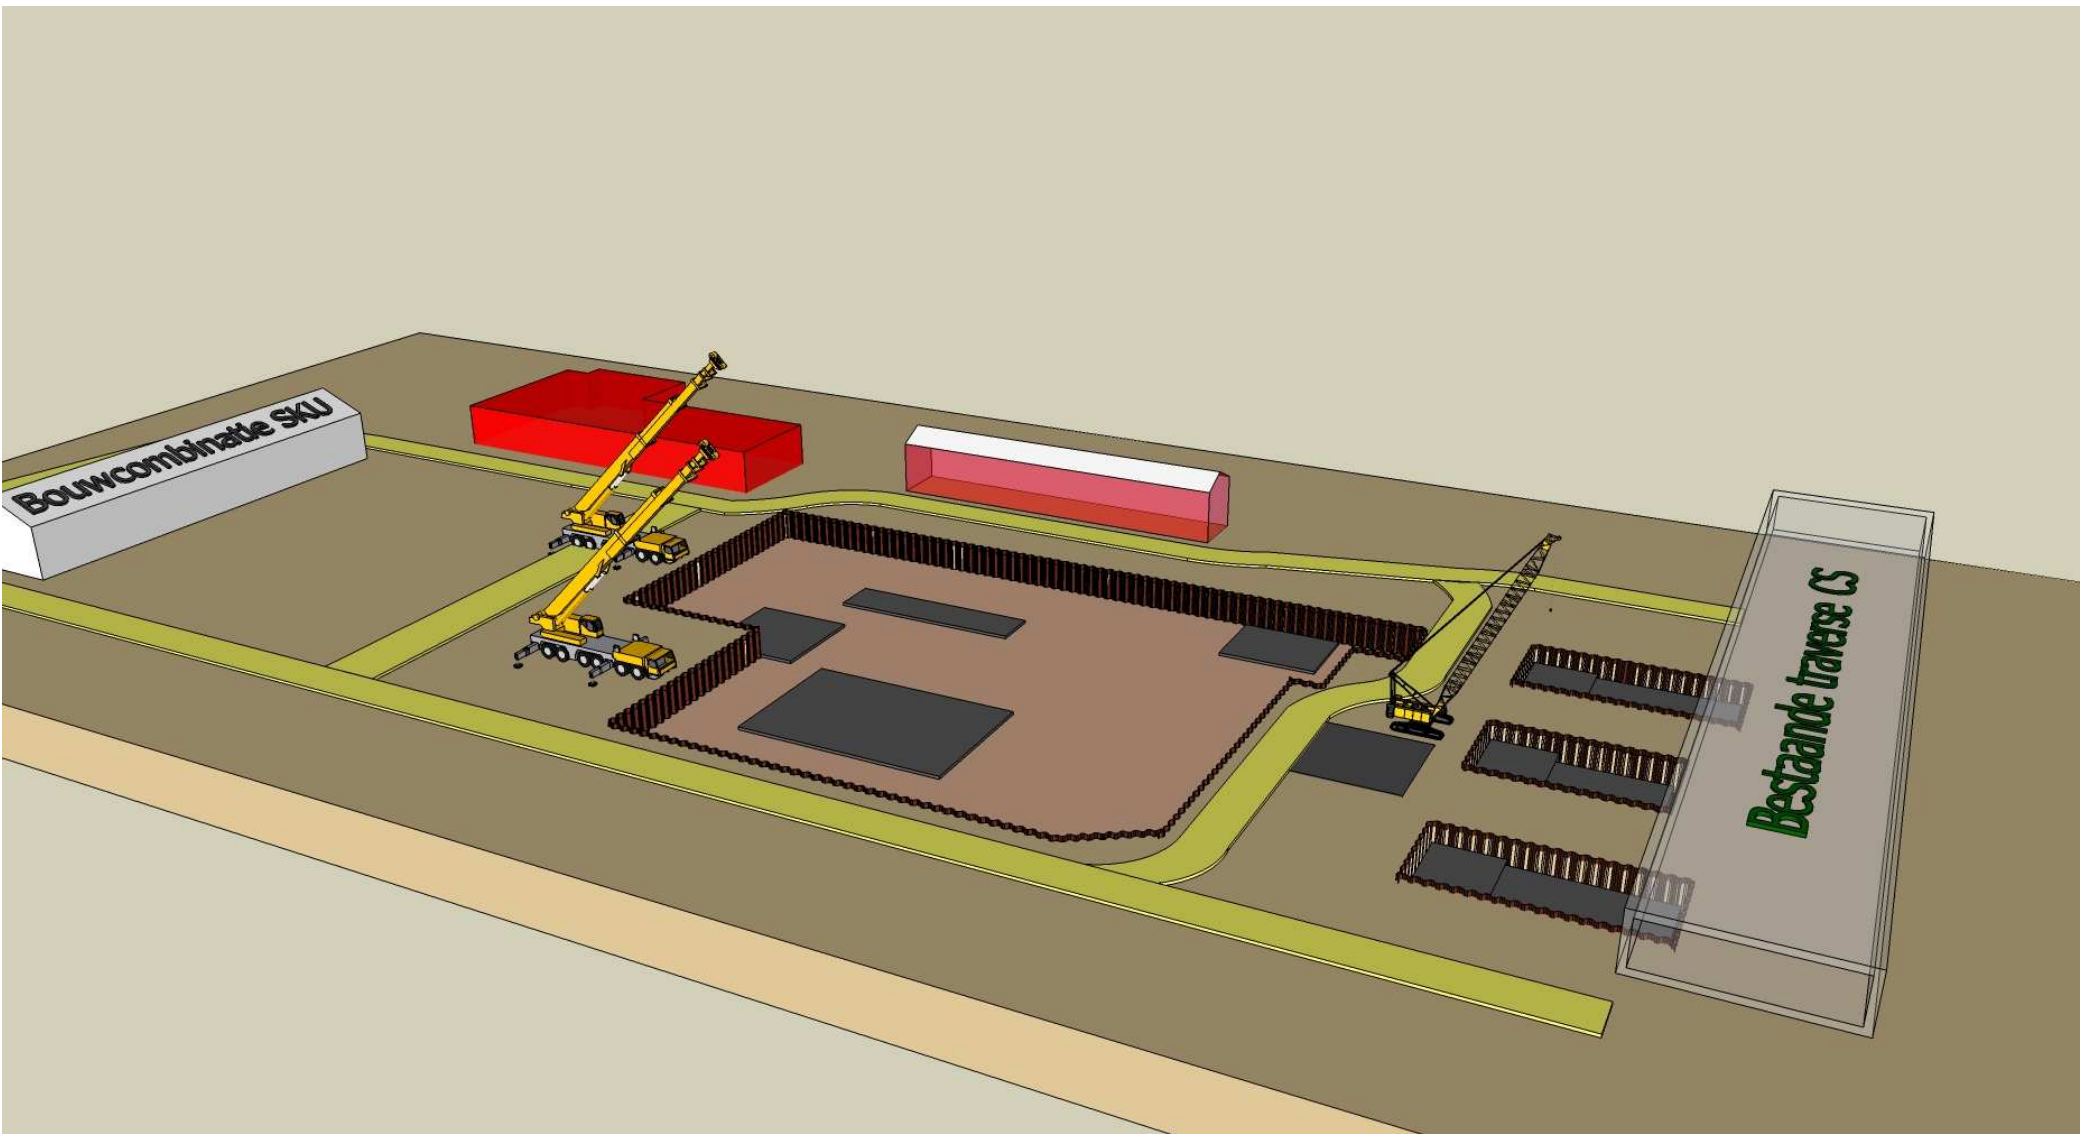


Noord vloerveld 1 van 4 gereed, start glijden
kleine kern, betonwerk fundering kelder

montage staalconstructie Zuid

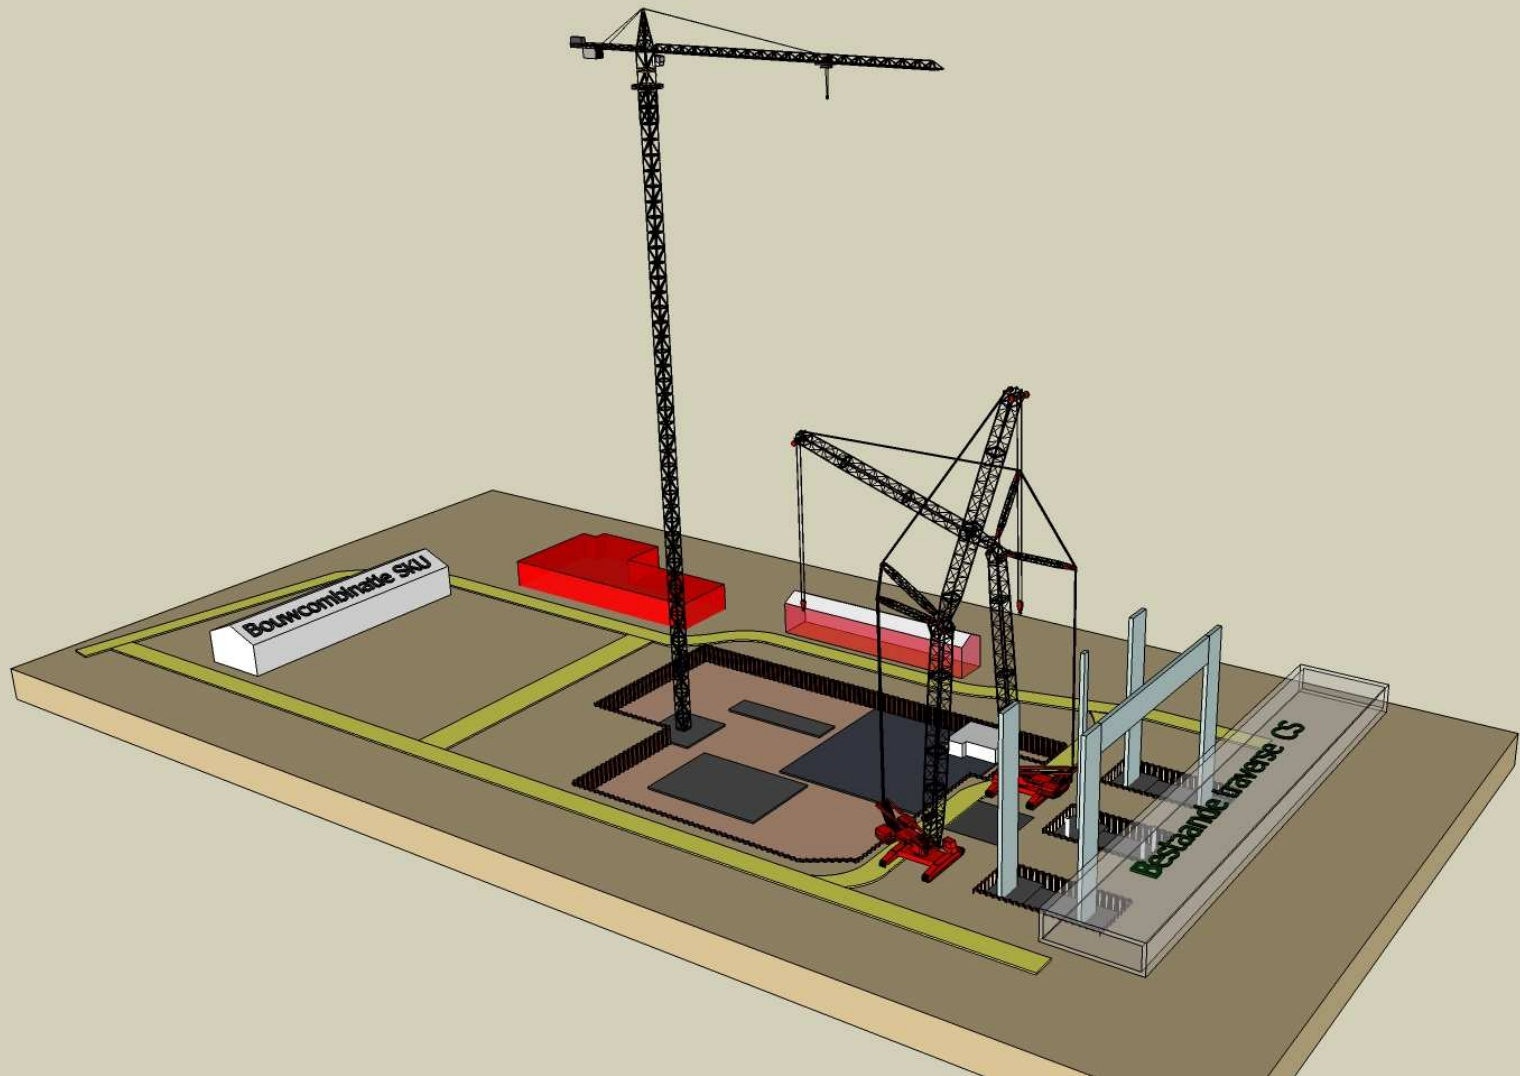

Noord glijden kleine kern,
start glijden hoofdkernen, betonwerk kelder


montage staalconstructie Zuid

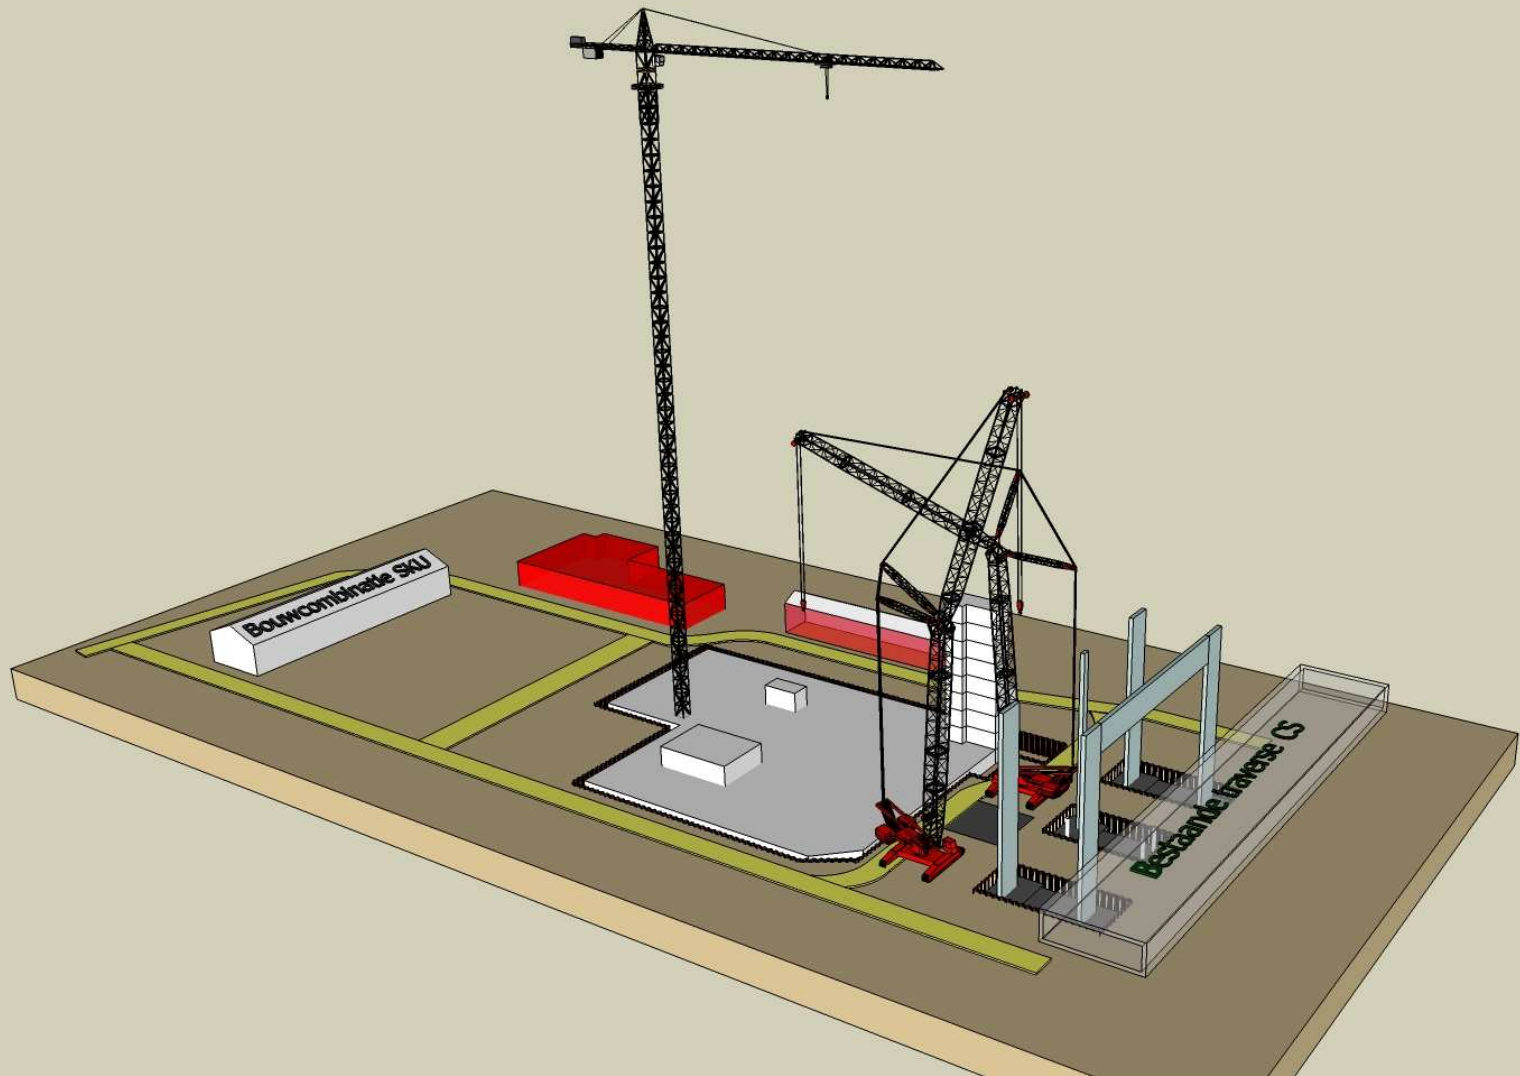

Noord hoofdkern glijden, betonwerk kelder, damwanden verwijderen


montage staalconstructie, betonbalken entreedek, damwanden verwijderen

Zuid

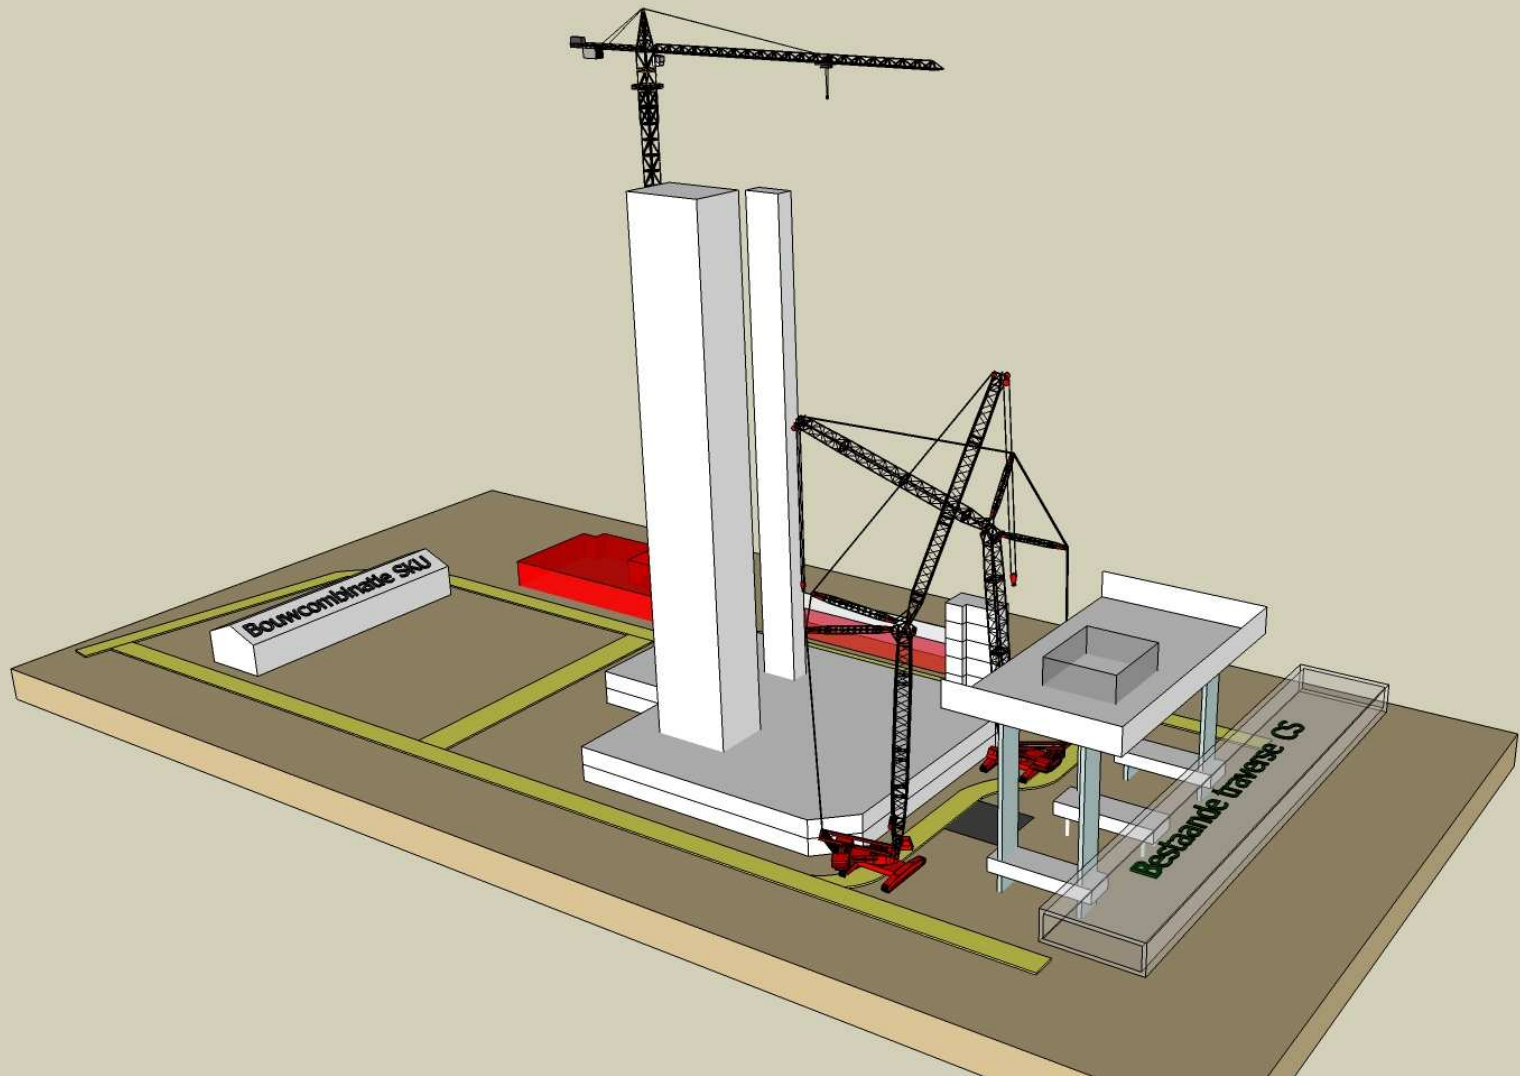

Noord hoofdkern glijden gereed, betonwerk kelder gereed


montage staalconstructie Zuid
betonbalken entreedek

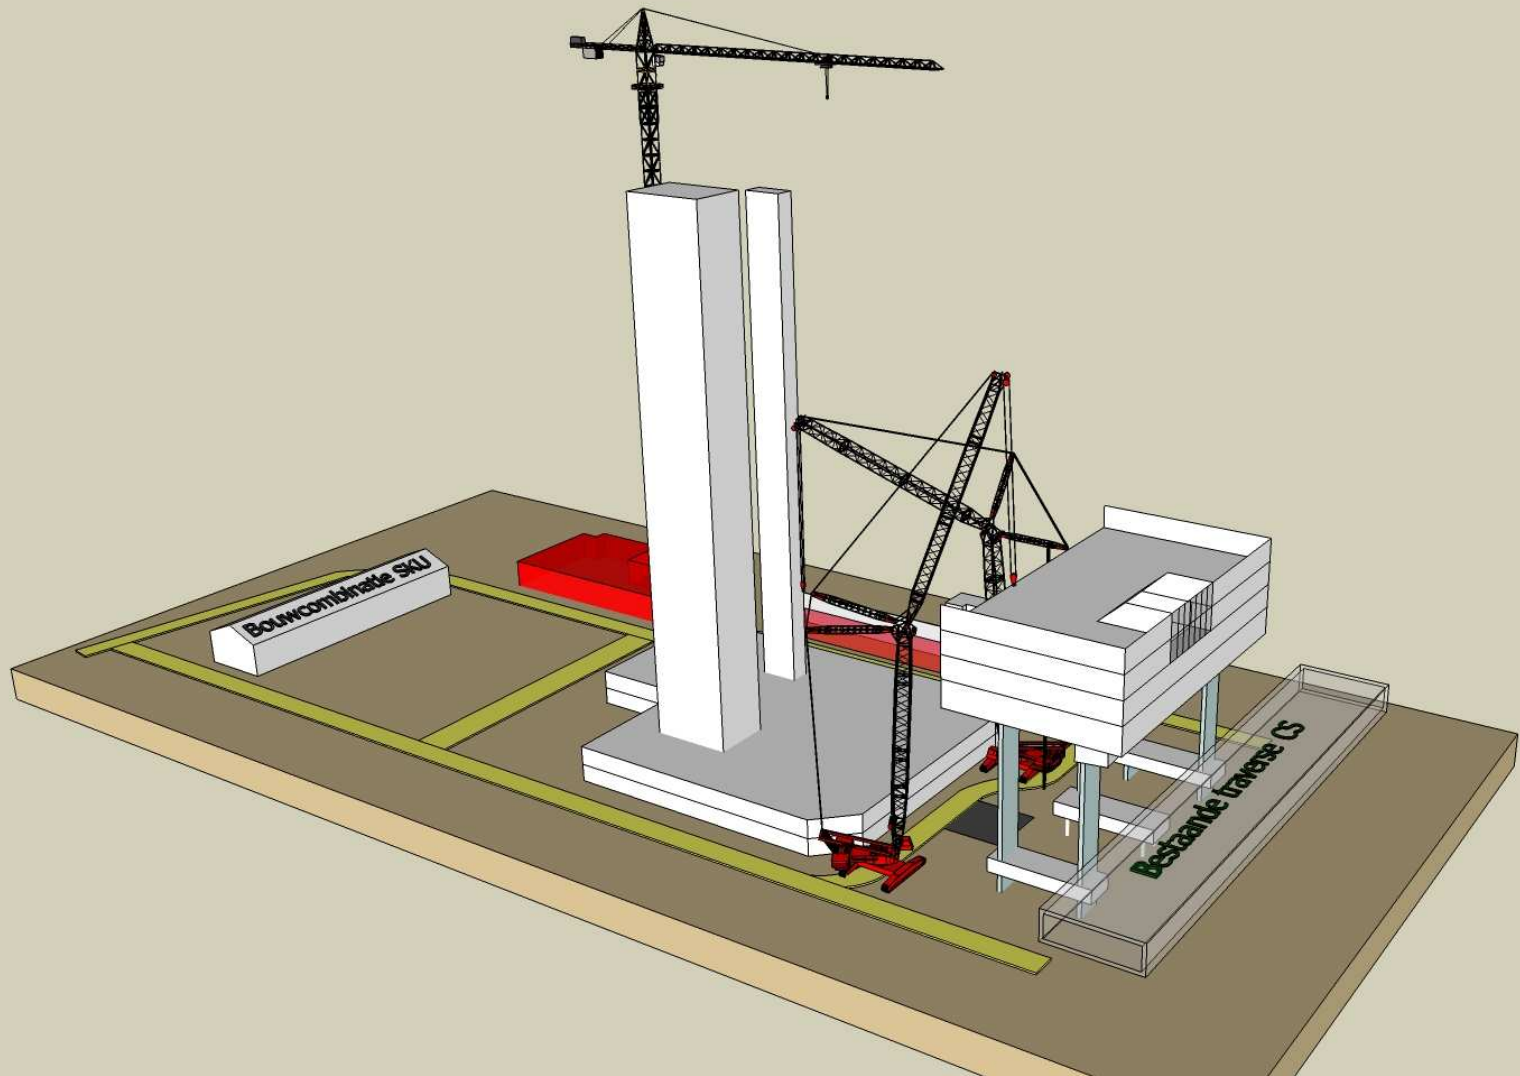


Noord torenkraan op kern
start montage staalconstructie

montage tijdelijke luifel tpv bestaande traverse
montage torenkraan


Zuid

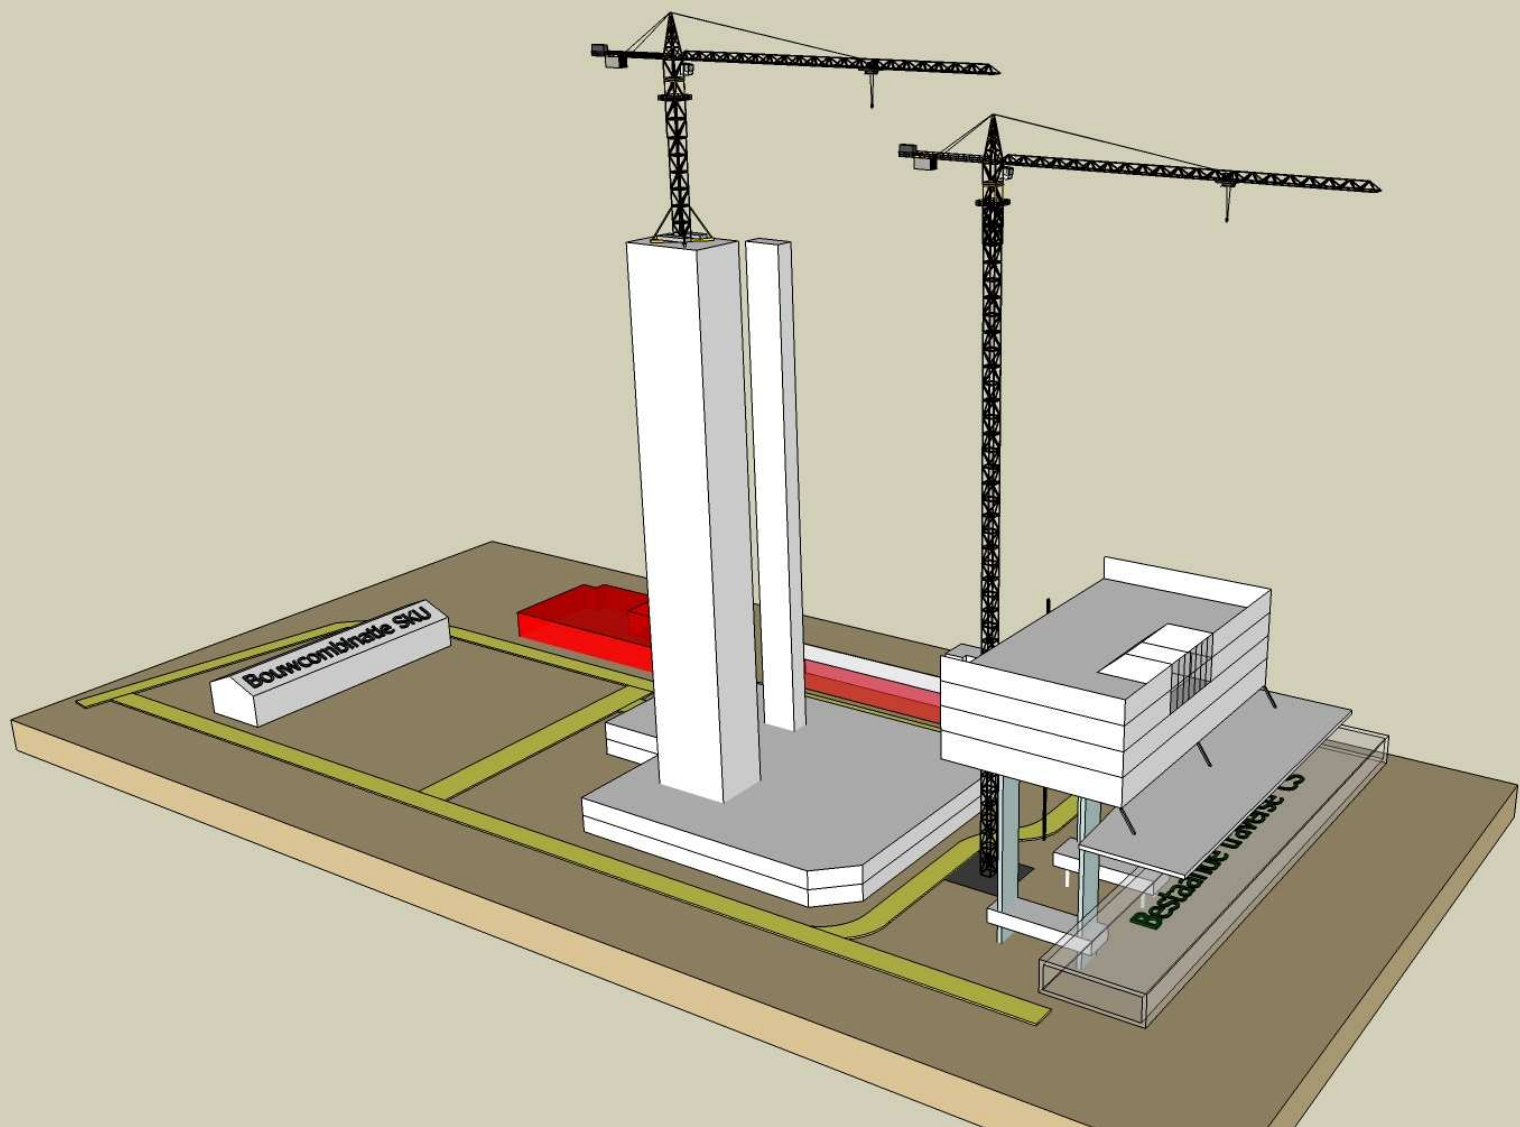


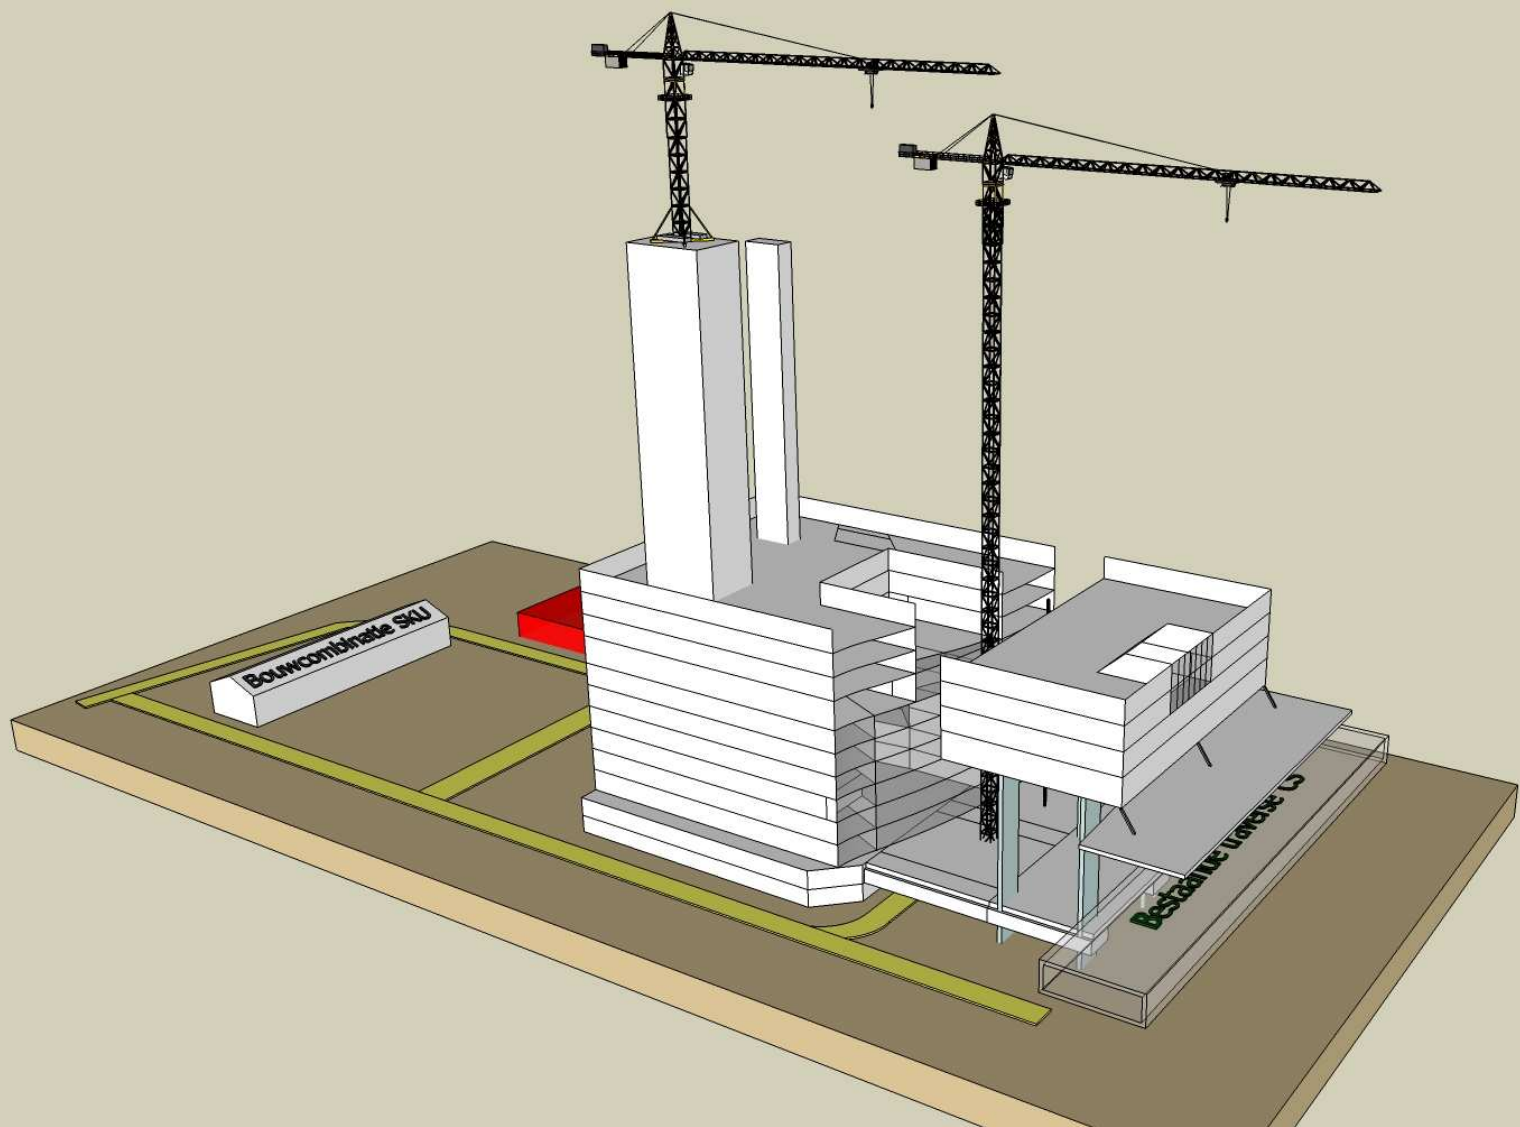

Noord staalconstructie t/m 12^e verdieping
start gevel vanaf begane grond

idem Zuid

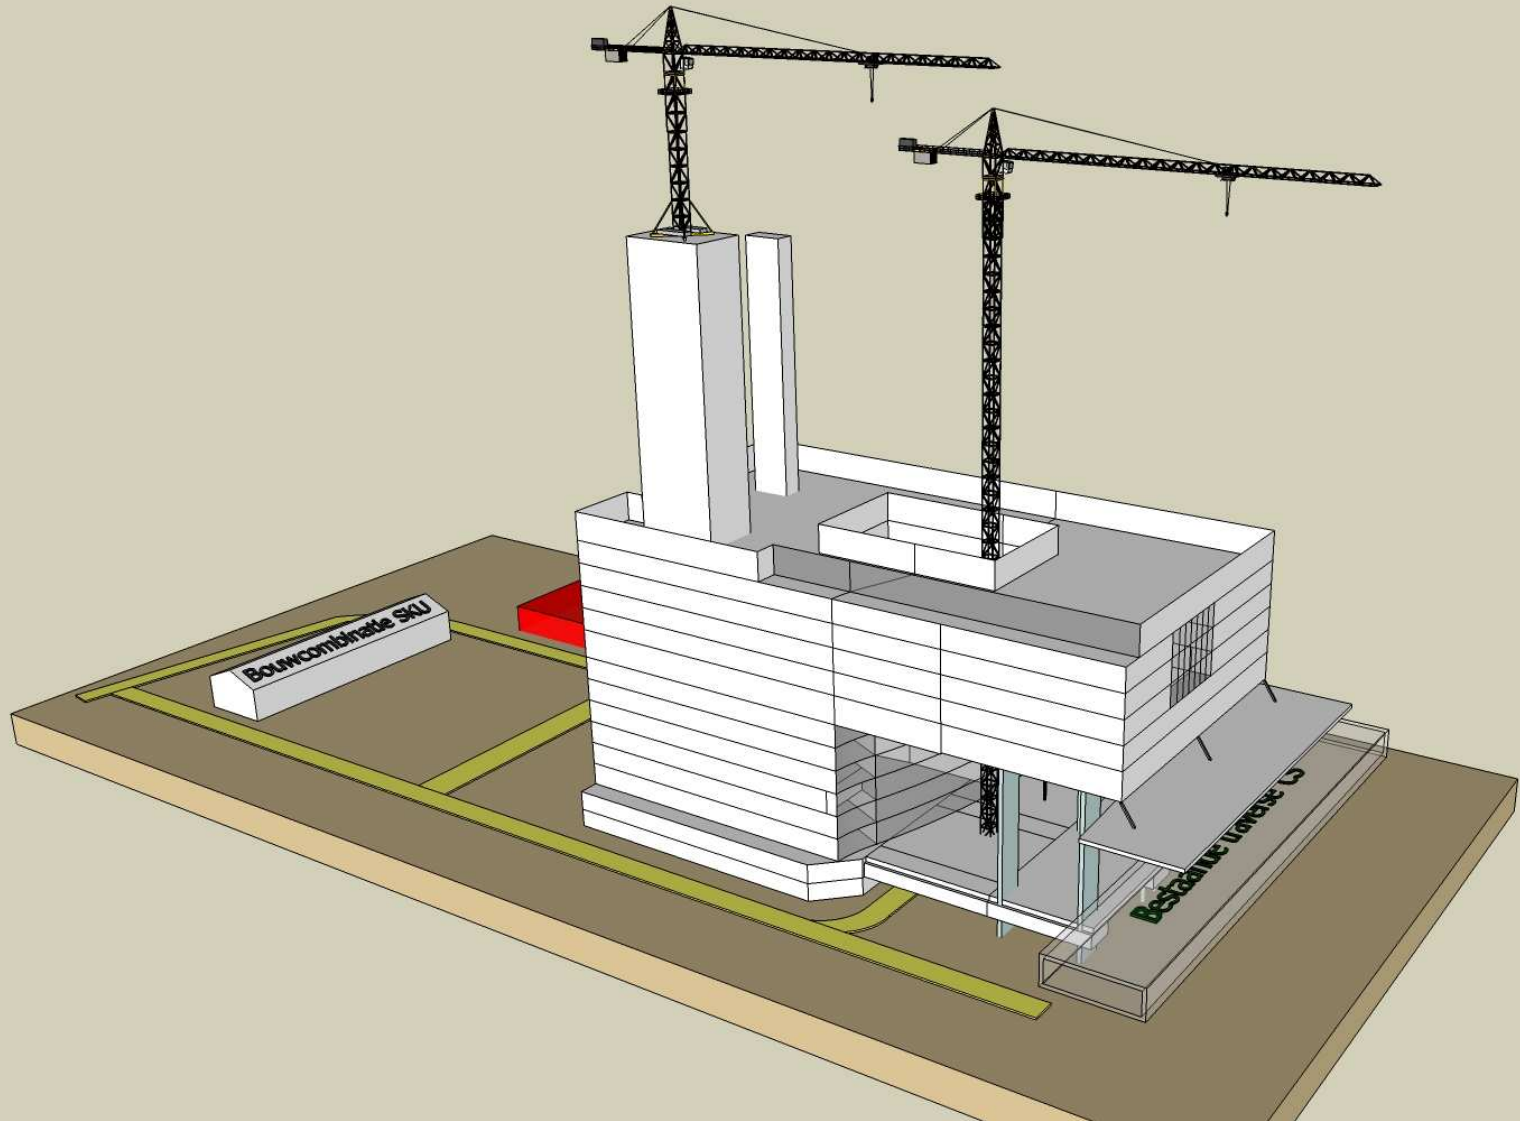

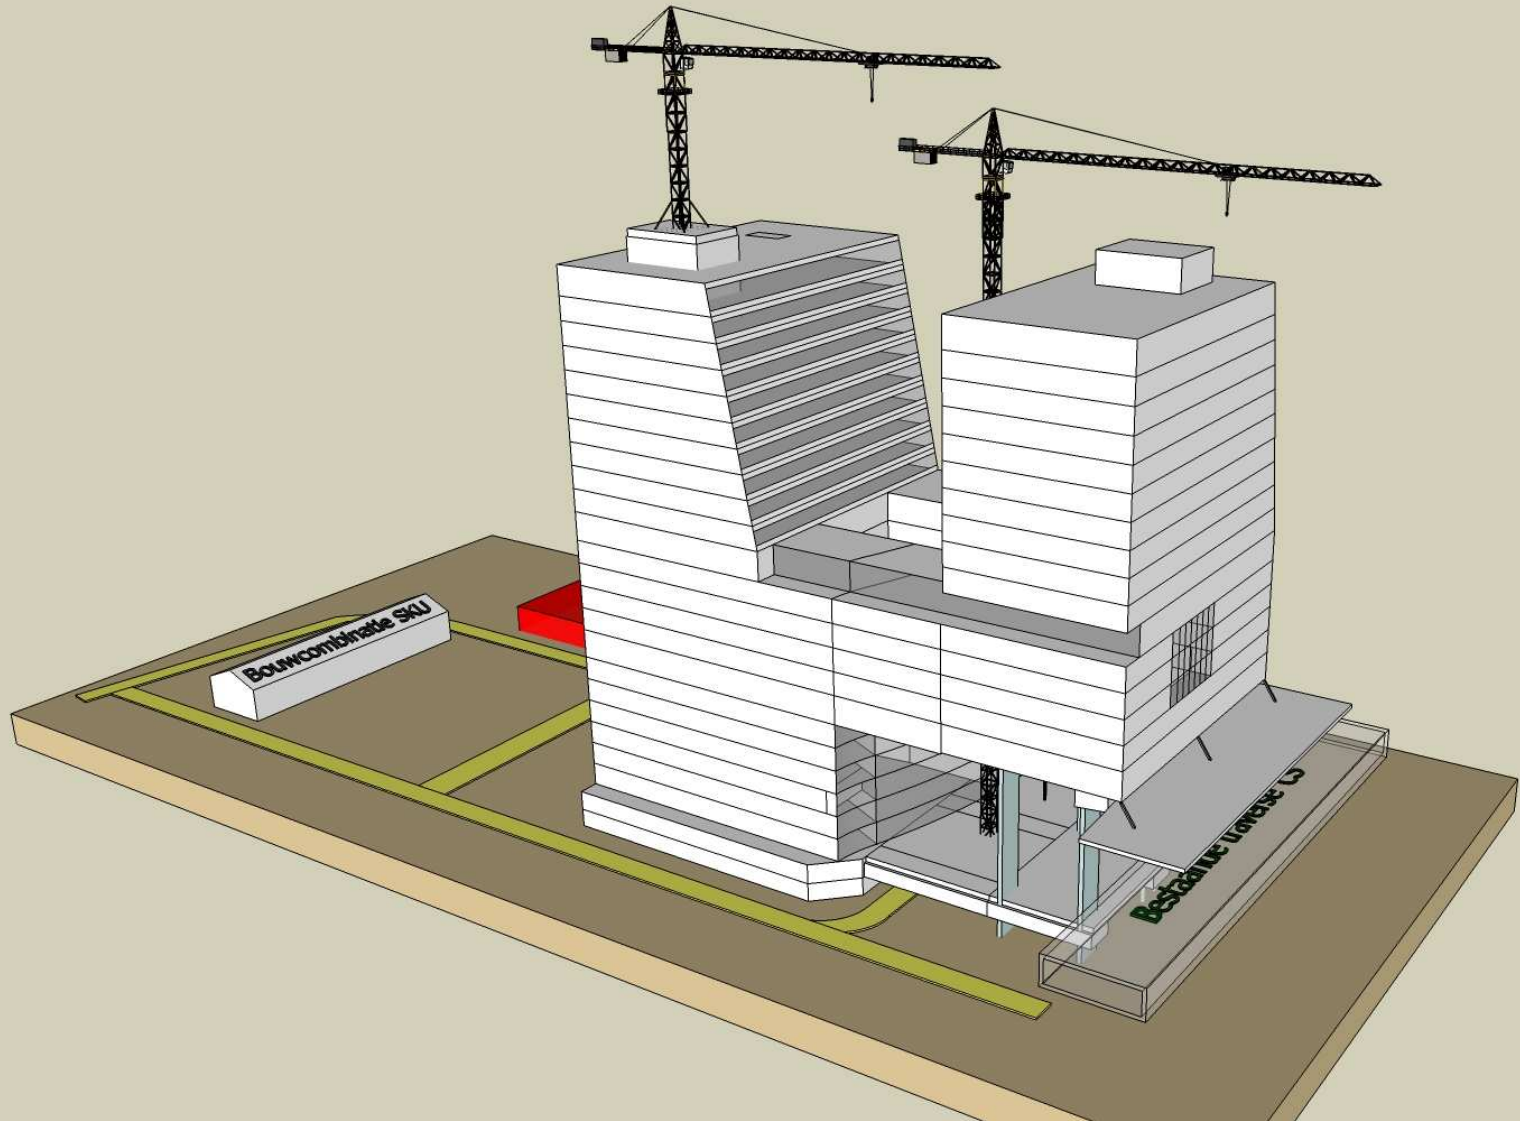

Noord staalconstructie + gevel gereed
verwijderen torenkranen

fase 2 OVT, omleiden voetgangers, sloop traverse, constructie kan op bgg

idem Zuid

